

Num. rapport: **20230018290-V.2**

### RAPPORT DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ : INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE

#### GENERALITE

Type d'installation: Nouvelle installation

Lieu d'inspection: Avenue Paul Hymans 126 /38, 1200 Woluwe Saint Lambert

Etage: 10

Référence: Livre I Chapitre 6.4.

Date d'inspection: 09/10/2023

Inspecteur:

Propriete de: .....

Pers.Cont.:

Documents de référence: Schémas

Type de locaux: Appartement

Type d'inspection: Contrôle de conformité avant mise en usage

Autres Reglements:

Prochain contrôle au plus tard le **09/10/2048** ou dans un délai de: 299 mois

Installateur: /

T.V.A.:

tel.:

#### DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Nom de l'entreprise distributrice d'électricité: SIBELGA

Numero EAN: Non disponible

Compteur: 5086036

Marque: COMTIGEA

Index I: 23984,9

Index II:

Raccordement: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)

Tension de serv.: 3x230V

I max. instal.: 25A

Prot. princ. branchement: 3P25A

Liaison comptage-coffre de repart.

Type de cable: XVB

Nombre de cond.: 3

Section: 10 mm<sup>2</sup>

#### CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Schémas conformes et signés: OUI

Description Installation:

 voir les schemas en annexe

Installation executee conformement aux schemas: en ordre

Inventaire des influences externes present et signe: en ordre

Protection contre les chocs electriques:

Différentiels essaie par bouton test: en

Contrôle des boucles de défaut: en ordre

ordre

Electrode de terre:

type: piquets

Continuite PE et liaison equipotentielle: en ordre

Matériel et influences externes: p.a

Inter.Diff.General: 4p 40A/300mA

Scellé par plombage: p.a

Diff. supplem.: 4p 40A/30mA

Différentiels: 4p 40A/30mA

Pas encore places: cuisine, salle de bains, Installation encore en travaux lors de notre passage . Eclairage, Appartement en travaux lors de notre passage . Plaques de finition interrupteurs &amp; prises, Porte du tableau,

Nombre de tableaux: 1

Nombre de circuit:

11

Adéquation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs: En ordre

Contrôle visuel du matériel fixe ou à poste fixe dangereux: En ordre

Adéquation entre le différentiel et la valeur de la resistance de dispersion de terre: En ordre

Contrôle visuel du matériel mobile à poste fixe dangereux: Pas d'application

#### CONCLUSION



#### L'INSTALLATION EST CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension et peut être mise en service. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1 (voir ci-dessus).

Pour le Directeur Technique,

L'inspecteur,

#### CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction au Livre 1 (I) - Dérogation (D) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

**N11()** - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..

**N12()** - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

**N13()** - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

L'inspecteur certifie avoir suivi toutes les étapes de la check-list: OUI


Ce rapport annule et remplace le rapport 20230018290 V.1

### **CONSEILS/REMARQUES:**

**Suivant la sous-section 6.4.6.4.b.7. du Livre 1, il est obligatoire de rappeler :**

- a) l'obligation de conserver le rapport dans le dossier de l'installation électrique ;
- b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Livre 1: RGIE approuvé (ou introduit) par l'arrêté royal du 08/09/2019.

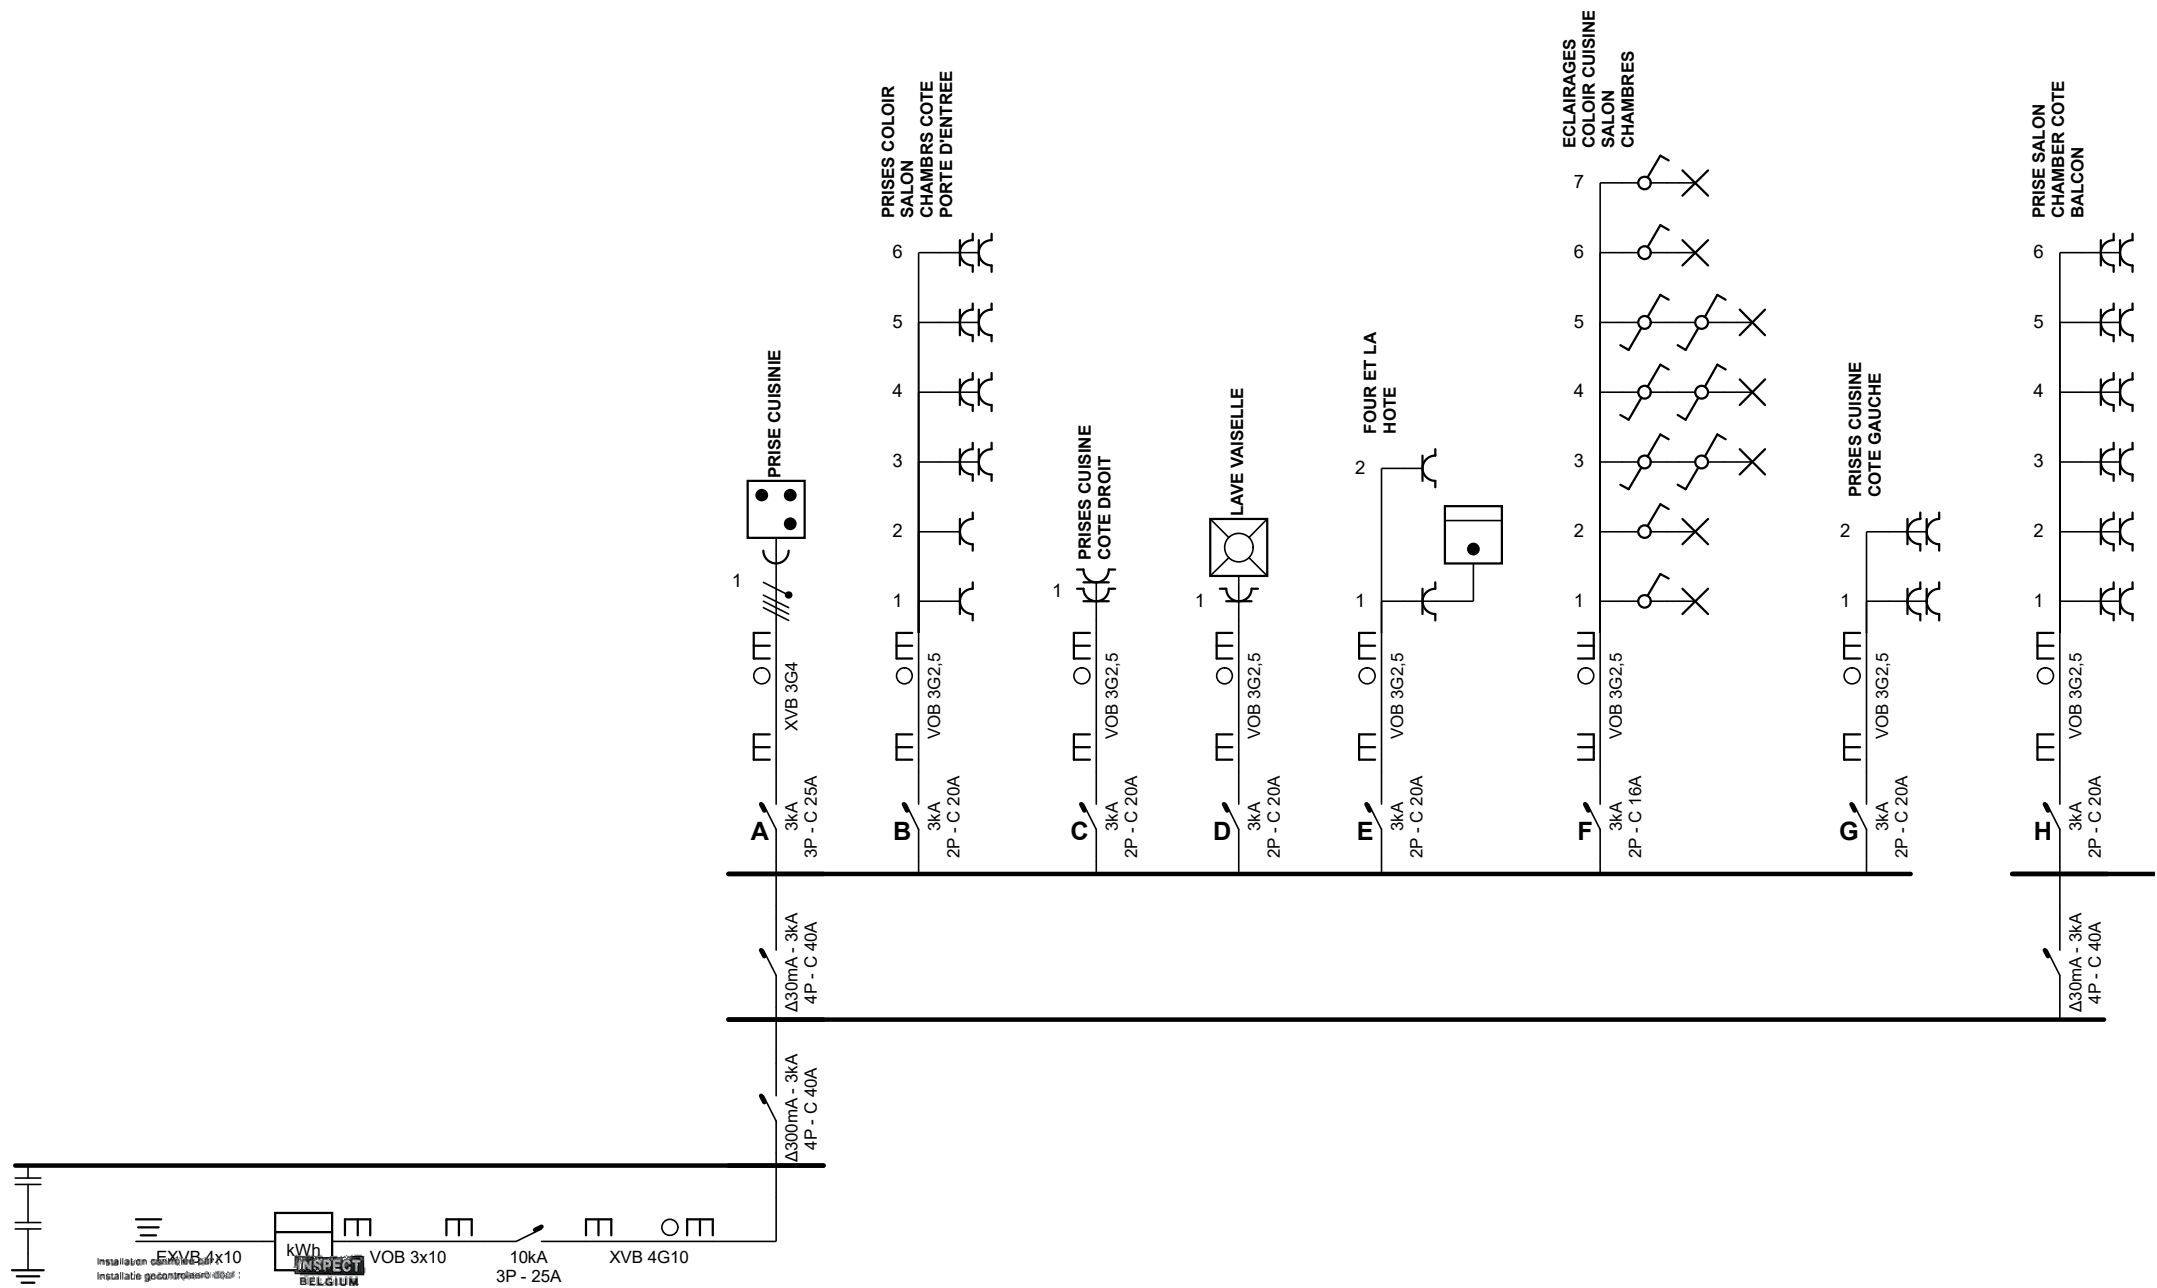


Installation controleerd door:  
 Installatie gecontroleerd door:  
 EXVB 4x10 kWh INSPECT BELGIUM VOB 3x10 10kA 3P - 25A XVB 4G10



**Installateur**

Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -


**p. 1/5**  
**Schéma unifilaire**  
 3 x 230V ~ 50Hz

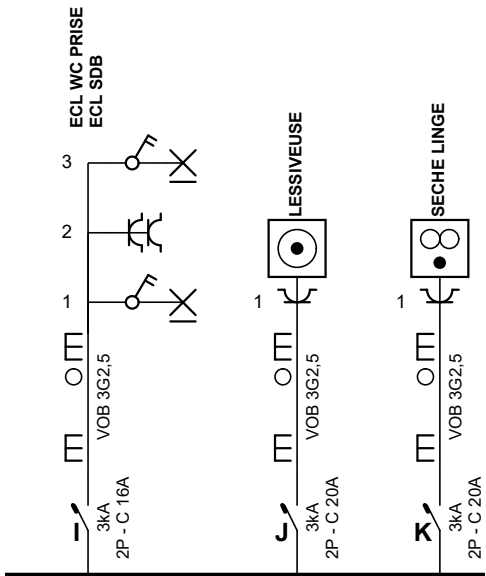

--

<b>Installateur</b>  Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -
--

<b>p. 2/5</b> <b>Schéma unifilaire</b>  3 x 230V ~ 50Hz
--

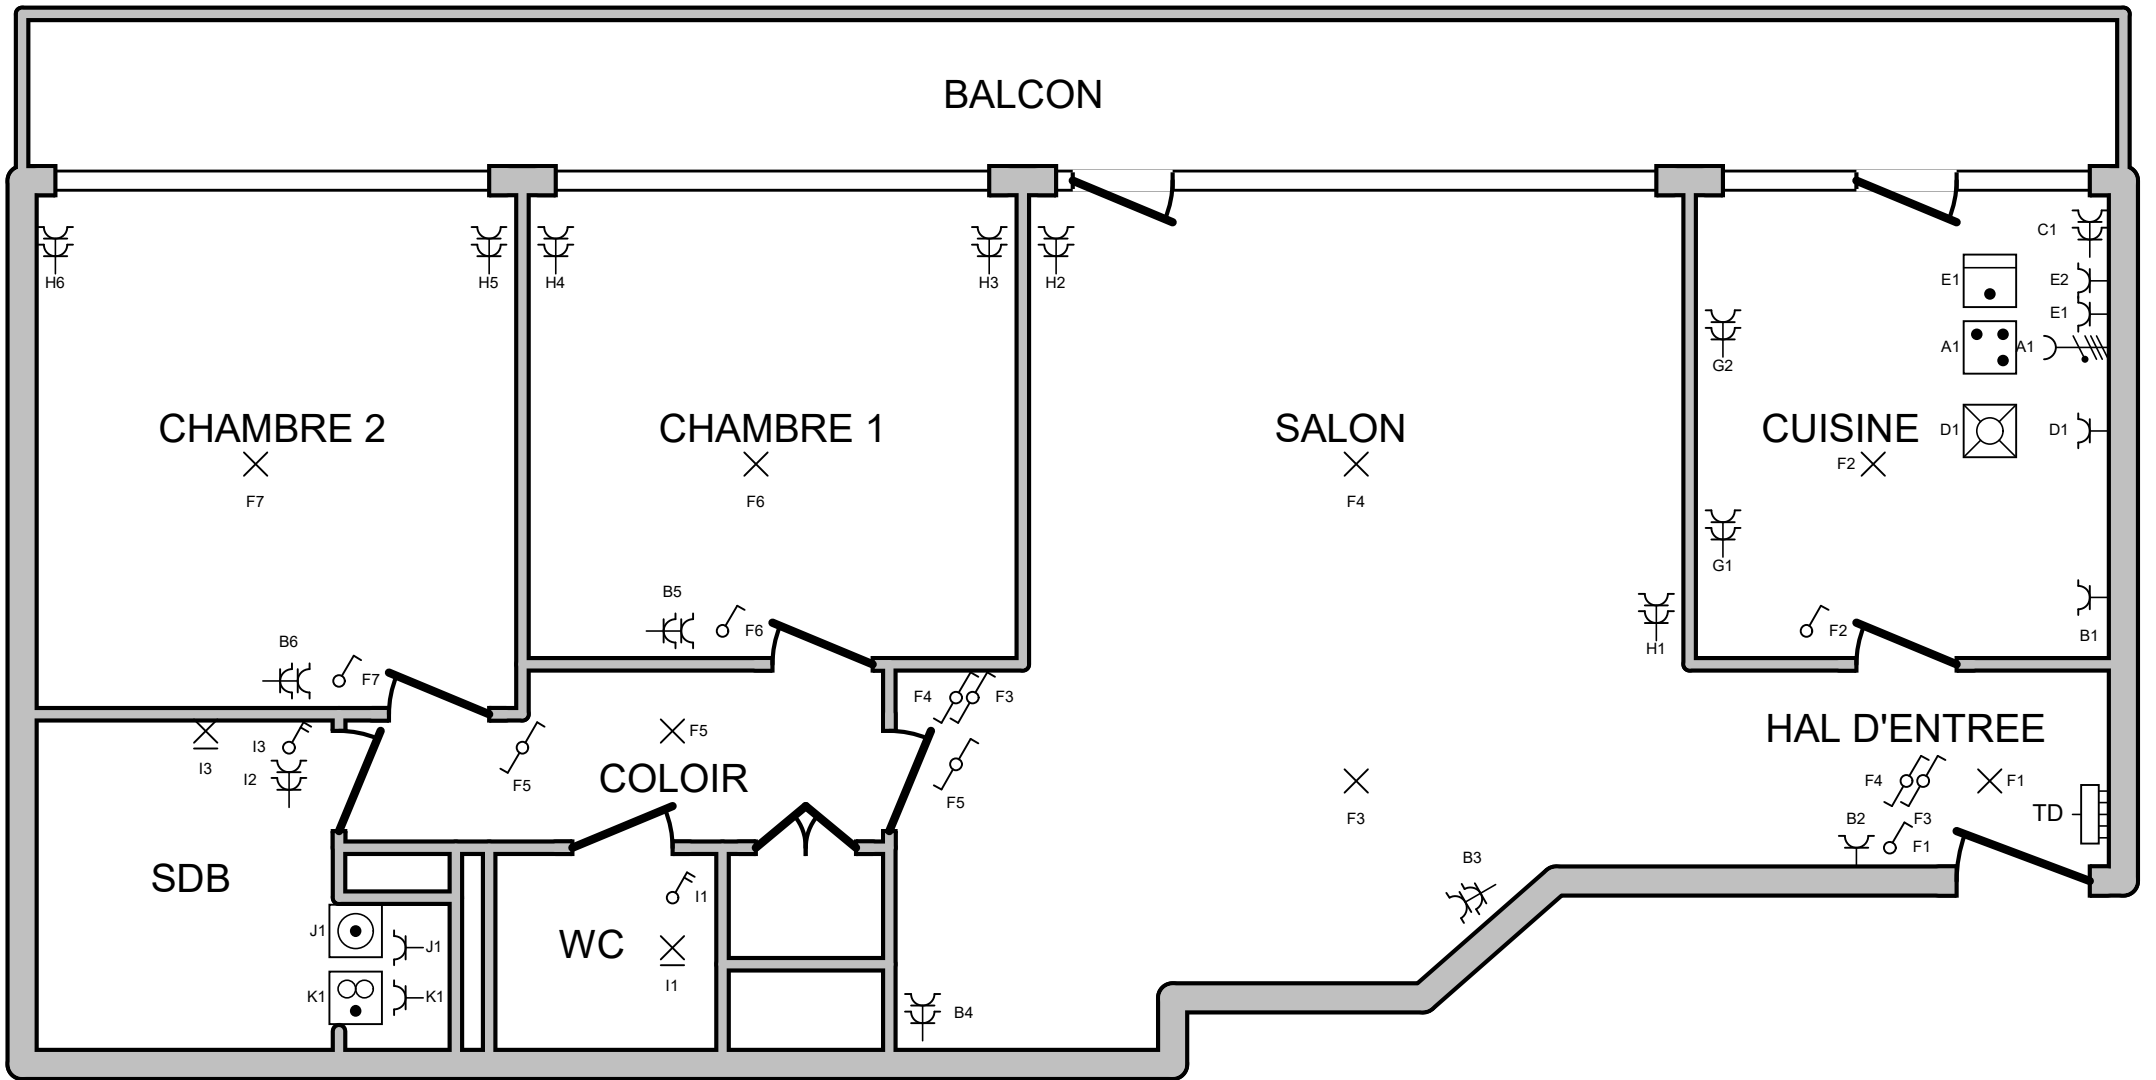

--

<b>Installateur</b>
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

<b>p. 3/5</b>
<b>Schéma de position</b>
3 x 230V ~ 50Hz

---

**A: PRISE CUISINIE**

---

**B: PRISES COLOIR SALON CHAMBR S COTE PORTE D'ENTREE**

---

**C: PRISES CUISINE COTE DROIT**

---

**D: LAVE VAISSELLE**

---

**E: FOUR ET LA HOTE**

---

**F: ECLAIRAGES COLOIR CUISINE SALON CHAMBRES**

---

**G: PRISES CUISINE COTE GAUCHE**

---

**H: PRISE SALON CHAMBER COTE BALCON**

---

**I: ECL WC PRISE ECL SDB**

---

**J: LESSIVEUSE**

---

**K: SECHE LINGE**

---

**Installateur**

Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

**p. 4/5  
Liste des circuits**

3 x 230V ~ 50Hz

Barrette de terre	1
Câble - EXVB 4x10	
Câble - VOB 3G2,5	
Câble - VOB 3x10	
Câble - XVB 3G4	
Câble - XVB 4G10	
Compteur - kWh	1
Disjoncteur - 10kA - 3P - 25A	1
Disjoncteur - 3kA - 2P - C 16A	2
Disjoncteur - 3kA - 2P - C 20A	8
Disjoncteur - 3kA - 3P - C 25A	1
Interrupteur - Bipolaire	2
Interrupteur - Unipolaire	4
Interrupteur différentiel $\Delta$ 300mA - 3kA - 4P - C 40A	1
Interrupteur différentiel $\Delta$ 30mA - 3kA - 4P - C 40A	2
Interrupteur va-et-vient - Unipolaire	6
Point d'éclairage	7
Point d'éclairage - Applique murale	2
Prise - 3Ph+N	1
Prise - Sécurité enfant	35
Tableau électrique	1
Terre	1

	<b>Installateur</b>	<b>p. 5/5</b>
	Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	<b>Liste des matériaux</b>
		3 x 230V ~ 50Hz
